

MonERP

MonERP төсөл бүрэн нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Үлдсэн ажил, хугацааны тооцоо, тест ба production нэвтрүүлэлтийн төлөв

Захиалагчид зориулсан танилцуулга

PDF / DOCX

Огноо: 2026 оны 5-р сарын 5

Бэлтгэсэн: MonERP төслийн баг

Хүлээн авагч: Захиалагч байгууллага

1. Гүйцэтгэлийн товч зураглал

Төслийн үндсэн хөгжүүлэлт хийгдсэн бөгөөд бүрэн нэвтрүүлэхийн өмнө mobile responsive, UI polish, ажиллагааны тест, алдаа засвар, production deployment ажлуудыг үе шаттайгаар хаах шаардлагатай.

Үлдсэн хугацаа

20 ажлын өдөр. Үндсэн төлөвлөгөө + deployment buffer багтсан.


Go-live зорилт

2026-06-02. Орчны бэлтгэл хугацаандаа баталгаажсан нөхцөлтэй.

Үндсэн focus

Responsive, UI polish, QA/UAT, bug fix, production checklist.

Одоогийн төлөвийн үнэлгээ

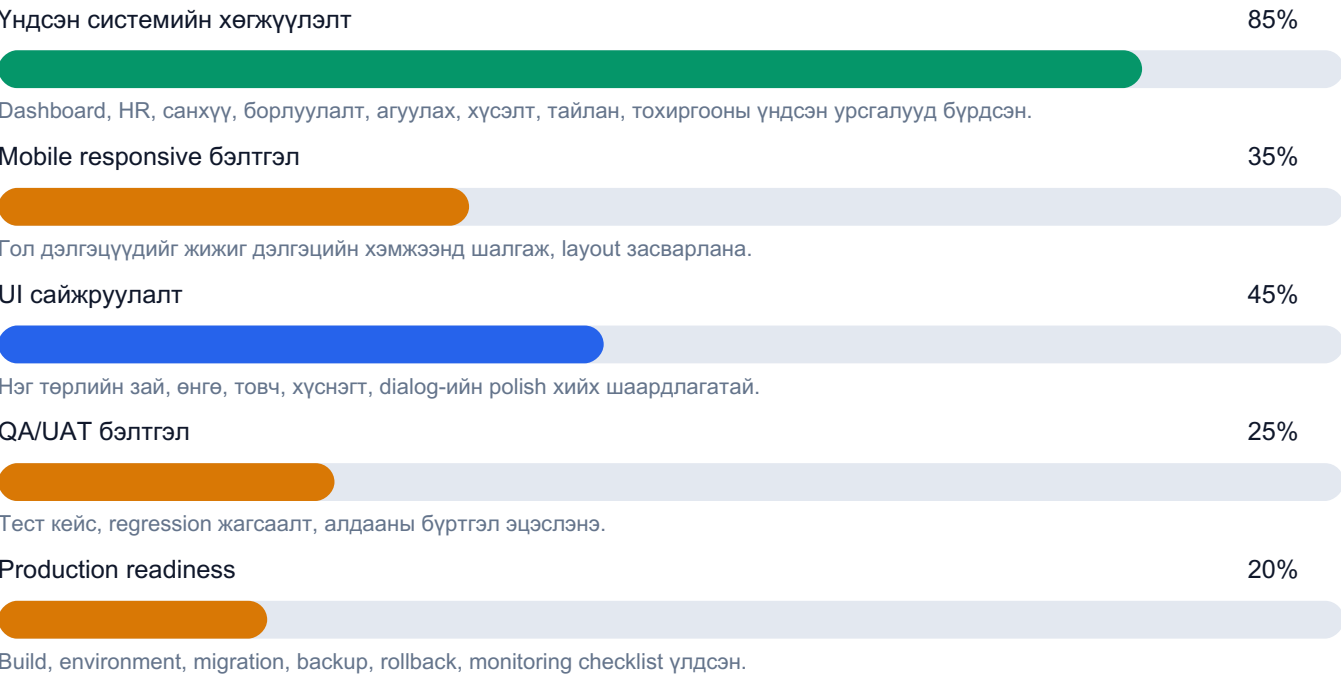


Хамрах үндсэн модулиуд

Dashboard ба тайлан	HR: ажилтан, хэлтэс, ирц, цалин
Хүсэлт, зөвшөөрөл, workflow	Санхүү: данс, журнал, татвар, баримт
Борлуулалт, худалдан авалт, агуулах	RBAC, audit log, тохиргоо
Цайны газар, тээвэр, нормын хувцас	eBarimt/QPay болон PDF/экспорт

2. Хугацааны тооцоо ба үе шат

Доорх төлөвлөгөө нь 2026-05-06-нд эхлэх хувилбараар тооцсон. Нийт хугацаа 20 ажлын өдөр бөгөөд тест болон production deployment-ийн эрсдэлийн buffer багтсан.

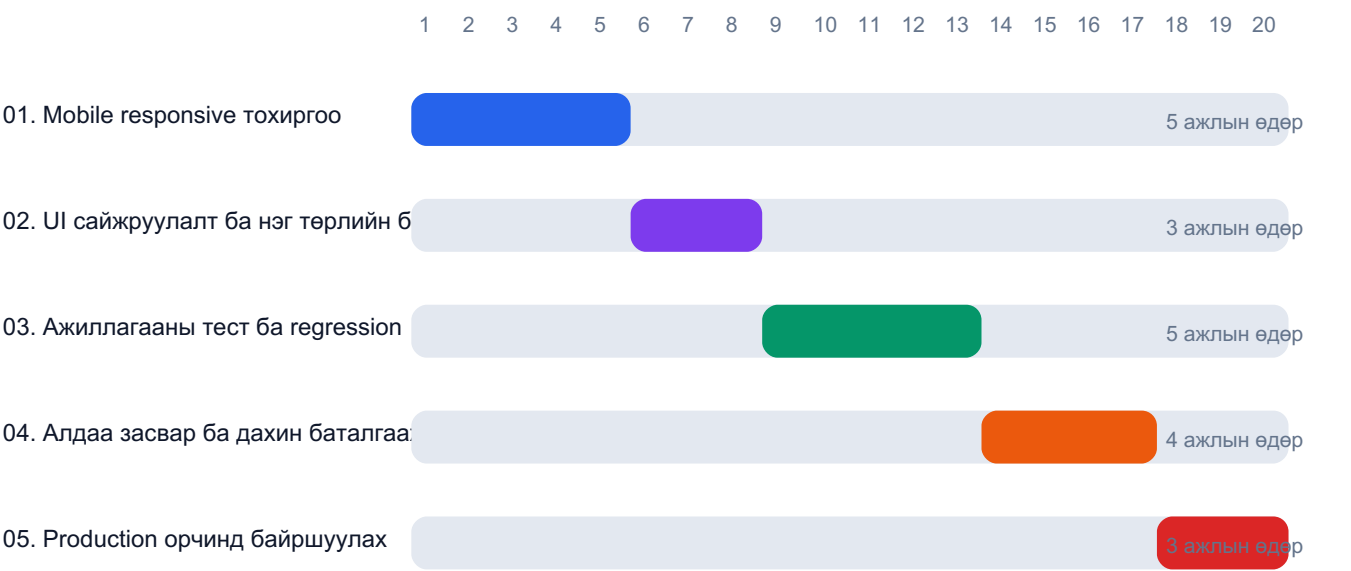

01. Mobile responsive тохиргоо | 5 ажлын өдөр

2026-05-06 - 2026-05-12. Гол хуудсууд 360px, 768px, 1366px+ дэлгэц дээр эвдрэлгүй харагдана.
02. UI сайжруулалт ба нэг төрлийн болгох | 3 ажлын өдөр

2026-05-13 - 2026-05-15. Захиалагчид харагдах үндсэн дэлгэцүүдийн polish, текст, empty/loading/error state цэгцэрнэ.
03. Ажиллагааны тест ба regression | 5 ажлын өдөр

2026-05-18 - 2026-05-22. Модуль бүрийн төстийн нотолгоо, issue log, UAT-д шилжүүлэх жагсаалт гарна.

2. Хугацааны тооцоо ба үе шат

04. Алдаа засвар ба дахин баталгаажуулалт | 4 ажлын өдөр

2026-05-25 - 2026-05-28. Critical болон major алдаанууд хаагдаж, production-д шилжих go/no-go шийдвэр гарна.

05. Production орчинд байршуулах | 3 ажлын өдөр

2026-05-29 - 2026-06-02. Production build, migration, SSL/domain, backup, rollback plan, handover checklist баталгаажна.

3. Үлдсэн ажлын дэлгэрэнгүй жагсаалт

01. Mobile responsive тохиргоо

5 ажлын өдөр | 2026-05-06 - 2026-05-12

- Dashboard, sidebar, topbar, table, form, dialog, mobile navigation шалгах
- Хэт өргөн хүснэгт, overflow, sticky action, input/button spacing засах
- iOS/Android browser дээр touch target ба scroll behavior шалгах

02. UI сайжруулалт ба нэг төрлийн болгох

3 ажлын өдөр | 2026-05-13 - 2026-05-15

- Card/table/form/button загварын ялгааг багасгах
- Монгол label, validation, хоосон төлөв, алдааны мэдэгдлийг ойлгомжтой болгох
- Critical workflow дээр action hierarchy, tooltip, badge, status өнгийг цэгцлэх

03. Ажиллагааны тест ба regression

5 ажлын өдөр | 2026-05-18 - 2026-05-22

- Нэвтрэх, эрхийн түвшин, ажилтан, ирц, цалин, хүсэлт, агуулах, борлуулалт, тайлангийн урсгал шалгах
- API, RBAC, database migration, импорт/экспорт, PDF/баримт хэвлэх урсгал шалгах
- Critical/major/minor ангиллаар алдааг бүртгэж давтан шалгах

04. Алдаа засвар ба дахин баталгаажуулалт

4 ажлын өдөр | 2026-05-25 - 2026-05-28

- Тестээс илэрсэн алдааг нөлөөллөөр нь эрэмбэлж засах
- Засвар бүр дээр smoke/regression retest хийх
- Нээлттэй үлдэх low priority item-уудыг post-launch backlog болгон тохирох


05. Production орчинд байршуулах

3 ажлын өдөр | 2026-05-29 - 2026-06-02


- Production env, database, storage, email, external service key тохируулах
- Build/deploy, smoke test, admin эрх, seed/initial data баталгаажуулах
- Backup/rollback, monitoring, handover, богино хэрэглэгчийн заавар өгөх

4. Тест ба чанарын баталгаажуулалт

Ажиллагааны тестийг модуль бүрийн бизнес урсгал, эрхийн түвшин, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, responsive UI, production smoke test гэсэн таван өнцгөөс гүйцэтгэнэ.

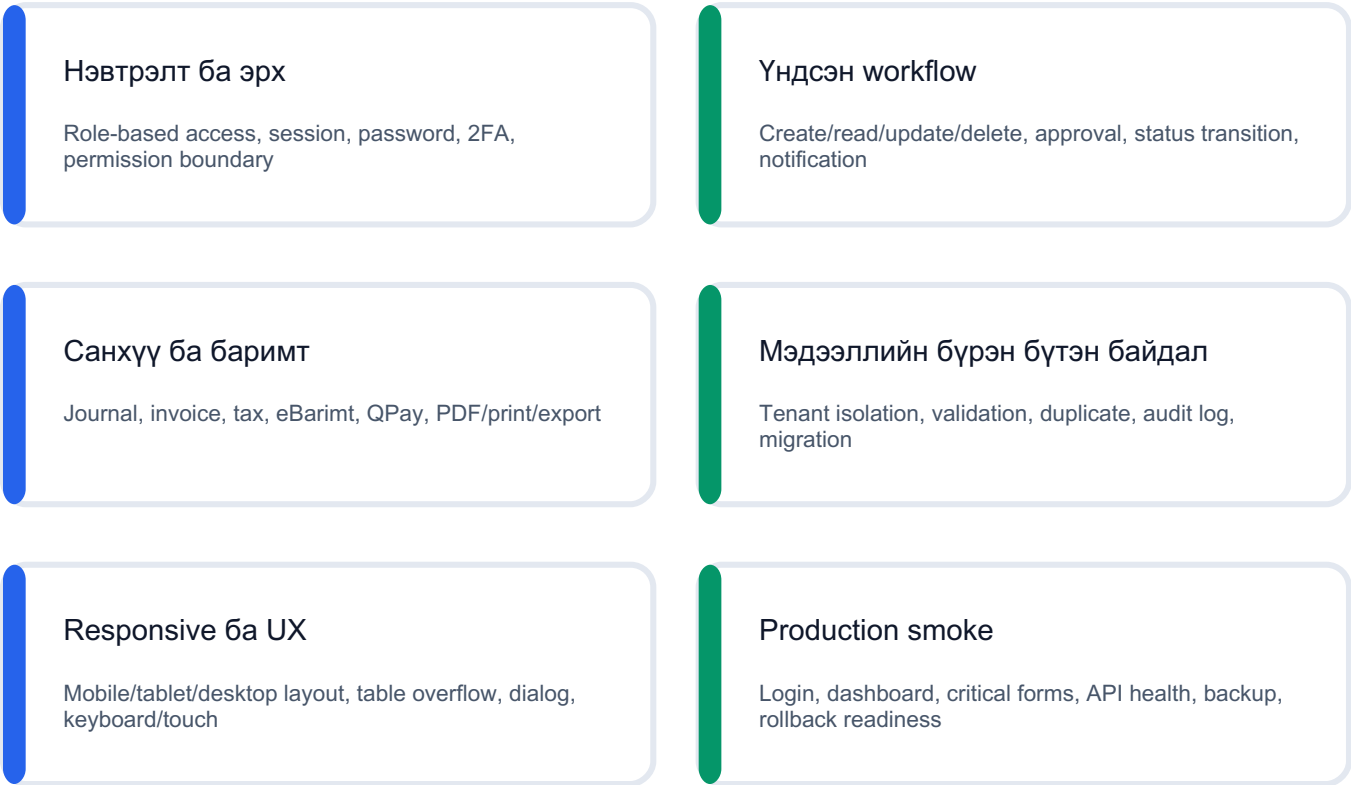

Test → Fix → Retest урсгал



5. Production deployment ба хүлээлгэн өгөх

Build

Production build үүсгэх

Config

ENV, DB, storage, email, service key

Migrate

Database migration, seed, backup

Deploy

Server/domain/SSL тохиргоо

Smoke

Critical workflow шалгах

Handover

Admin эрх, заавар, checklist

Хүлээлгэн өгөх материал

- Production deployment checklist ба орчны тохиргооны бүртгэл
- Тестийн үр дүн, хаагдсан/нээлттэй issue log
- Rollback болон backup сэргээх богино төлөвлөгөө
- Админ хэрэглэгчийн эрх, үндсэн workflow-ийн богино заавар
- Post-launch 1 долоо хоногийн hypercare жагсаалт

6. Эрсдэл ба захиалагчаас шаардах зүйлс

1. Production орчны эрх/нууц түлхүүр хоцрох

Нөлөө: Deployment хугацаа сунана. Урьдчилан сэргийлэх: Эхний долоо хоногт checklist-ээр баталгаажуулах.

2. UAT үед нэмэлт scope гарах

Нөлөө: Хугацаа ба өртөг нэмэгдэнэ. Урьдчилан сэргийлэх: Change request байдлаар тусад нь үнэлэх.

3. Гаднын үйлчилгээний sandbox/production ялгаа

Нөлөө: eBarimt/QPay тест удааширна. Урьдчилан сэргийлэх: Sandbox болон production credential-ийг эрт шалгах.

4. Өгөгдөл migration/seed алдаа

Нөлөө: Go-live эрсдэлтэй. Урьдчилан сэргийлэх: Backup, rollback, rehearsal migration хийх.

Шаардлагатай шийдвэрүүд

- Go-live огноо болон UAT sign-off хийх хариуцагчийг баталгаажуулах
- Production server/domain/SSL/database нэвтрэх эрхийг төслийн багт өгөх
- eBarimt, QPay, email/SMS зэрэг гаднын үйлчилгээний production credential өгөх
- Нээлттэй үлдэх low priority ажлыг post-launch backlog болгон батлах
